Oswald Künzi

Bauprogramm

Author: P. Perret

Erstellungsdatum: 26. März 2008, 08:00

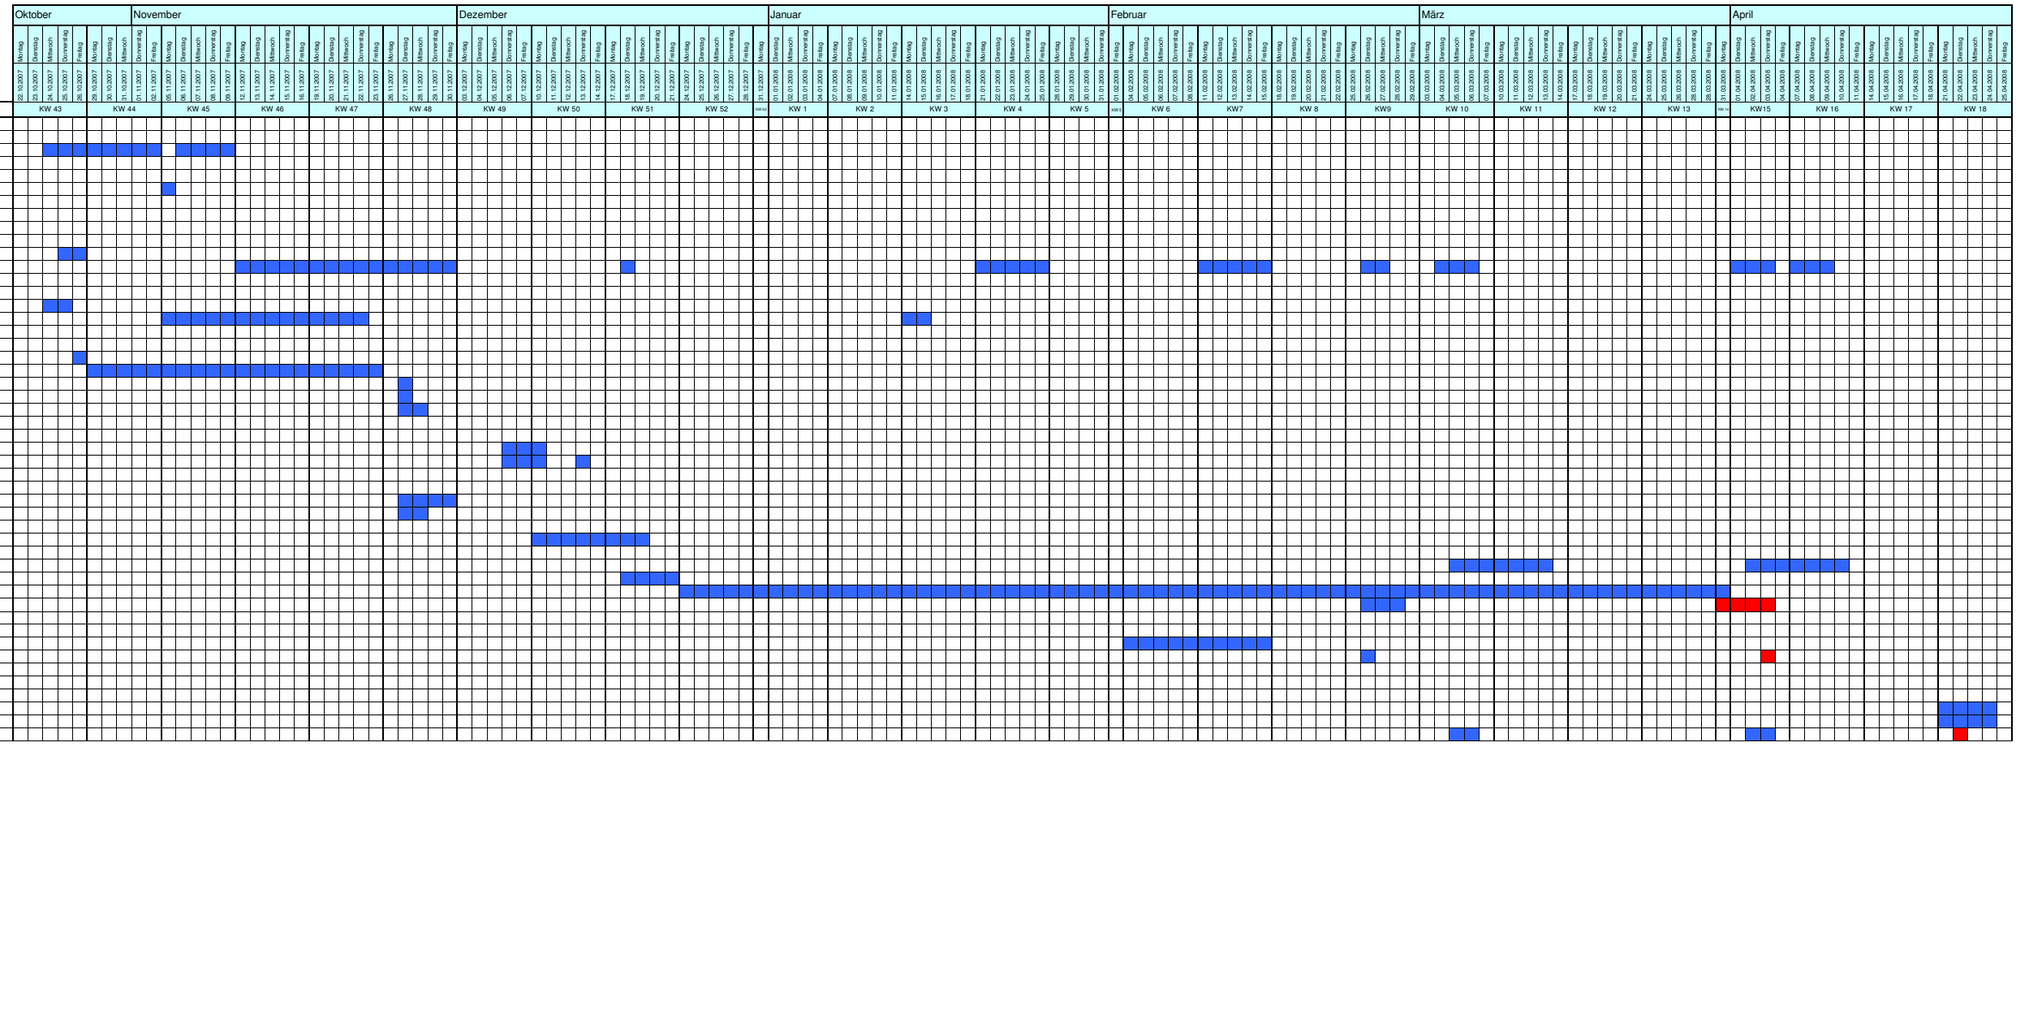

Arbeitsgattung	Firma
Baumeisterarbeiten:	Hans Egger/Mamie
Aushub für Mastfundament	
Schalen, armieren u. betonieren Mastfundament	
Maskorbverankerung betonieren	
Aushub/Armierung/Durchbruch für Kabelkanal	
Umgebungsarbeiten	
Elektroinstallation:	Oswald Künzi
Niesenlicht demotieren, Provisorium stellen	Oswald Künzi/Fritz Wäfler
Elektrische Installationen	
Innenausbau Technikraum/Notstrom:	Fritz Wäfler + Team
Räumung	
Isolation/Brandschutz/Türe/Fenster	Armin
Stahlbau:	Mamie/Letrona
Lieferung Mastkorbverankerung	
Fabrikation Mast	Letrona
Lieferung Mast	
Vormontage Mast	
Mastmontage	
Richtstrahlsysteme	Sumatronic/Dominik Gaul
Montage Aussenspiegel/Verkabelung	
Rack stellen/ Installation/Konfig. Gerätschaften/Verk.	
Antennensysteme	Mamie
Kabel verlegen (Coax/Strom/Cat7)	
Antennen Montage	Letrona/Mamie
Sendeanlagen	Mamie
Vor/Endstufe Provisorium installieren/konfig.	
Vor/Endstufe inkl. SRC installieren/konfig.	Sumatronic
1. Testlauf Vor/Endstufe Provisorium	
2. Testlauf Provisorium Ant1+2	
3. Testlauf Vor/Endstufe Definitiv(Werk anschl. Niesen)	
Notstomanlagen	Bimex
Installation Aggregat/Steuerung/Auspuff	
USV installieren/konfigurieren	
Testlauf USV/Notstrom	
Projektabschluss	PL/Alle
Systemdesign/Spezifikation/Handbücher fertigstellen	
Abnahme Sender-/Antennen-/Richtfunk-/Netzsysteme	
Initialisierung Projekt Neuplanung Sendernetz	
