Perret Patric, Maurer Stefan

Gesamtplanung Projekt NIVIEW Weathercam Niesen
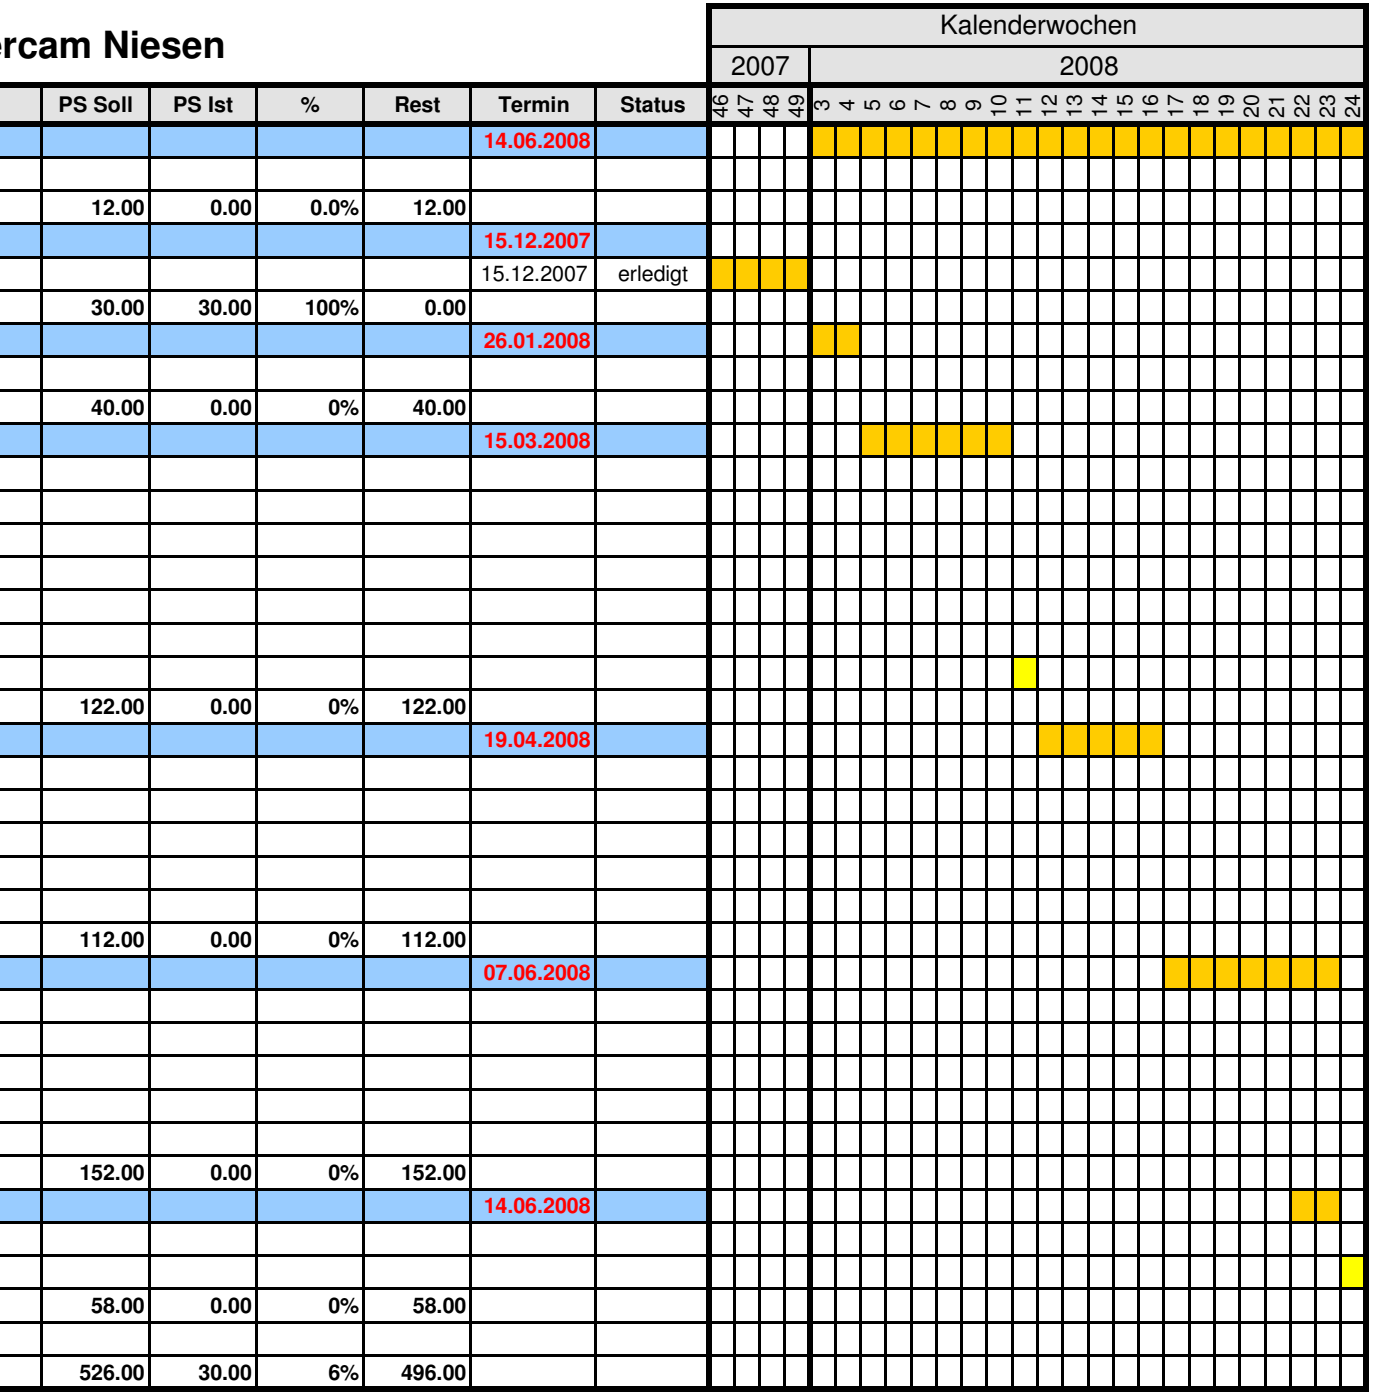
Nr.	Aktivität	PS Soll	PS Ist	%	Rest	Termin	Status
Controlling						**14.06.2008**	
0	Controling						
	Total Aufwand (in Stunden)	**12.00**	**0.00**	**0.0%**	**12.00**		
Diplomeingabe						**15.12.2007**	
1	Diplomeingabe und Aktivitätenplanung erstellen					15.12.2007	erledigt
	Total Aufwand (in Stunden)	**30.00**	**30.00**	**100%**	**0.00**		
Projektauftrag						**26.01.2008**	
2	Projektauftrag erstellen und genehmigen						
	Total Aufwand (in Stunden)	**40.00**	**0.00**	**0%**	**40.00**		
Vorstudie						**15.03.2008**	
3	Informationsbeschaffung						
4	Anforderungskatalog erstellen						
5	Varianten erarbeiten und analysieren						
6	Entscheidungsgrundlagen erstellen						
7	Variantenempfehlung erstellen						
8	Bericht Vorstudie erstellen						
9	Vorstudienbericht Präsentation						
	Total Aufwand (in Stunden)	**122.00**	**0.00**	**0%**	**122.00**		
Hauptstudie						**19.04.2008**	
10	Konzept Bildverarbeitung						
11	Konzept Wetterdaten						
12	Konzept Datenbereitstellung						
13	Detailplanung Prototyping						
14	Präsentation Auftragsgeber und Nachbearbeitung						
	Total Aufwand (in Stunden)	**112.00**	**0.00**	**0%**	**112.00**		
Prototyping						**07.06.2008**	
15	Prototyp Datenbank erstellen						
16	Prototyp Wetterstation erstellen						
17	Prototyp Bilderfassung						
18	Prototyp Website						
19	Handbücher						
	Total Aufwand (in Stunden)	**152.00**	**0.00**	**0%**	**152.00**		
Projektabschluss						**14.06.2008**	
20	Berichte						
21	Diplomberichtbericht Präsentation						
	Total Aufwand (in Stunden)	**58.00**	**0.00**	**0%**	**58.00**		
	Total Gesamtaufwand (in Stunden)	**526.00**	**30.00**	**6%**	**496.00**
